Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Maroc - Projet Justice "Mahkamati" - Plan de Passation des Marches

I. General

1. **Information sur le Projet**

Nom du Projet:	Projet de renforcement de la Performance des Juridictions et du Service a
Pays:	Maroc
Référence du Projet :	P125799
Numéro du Prêt/Crédit:	

2. **Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés pa** Original: 23 avril 2012
   révision 1 30-Apr-13
   Ajouter de nouvelles revisions

3. **Date d'Avis Général de Passation des Marchés**

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. **Seuil de Revue à Priori**

1a.

Type de Marché	**Seuil de Revue à Priori (USD)**	**Commentaires**
Travaux	N/A	Le premier marche de Travaux par AON sera soumis a la revue prealable de la Banque
Fournitures,	3,000,000	Tous les marches de Fournitures dont le montant est superieur ou egal a l'equivalent de 3.000.000 US$, le premier marche de Fournitures par AON ainsi que les marches passes par Entente directe seront soumis a la revue prealable de la Banque
Services autres que services de consultants	3,000,000	Tous les marches de Services autres que les services de consultants dont le montant est superieur ou egal a l'equivalent de 3.000.000 US$, le premier marche de Services autres que les services de consultants passé par AON ainsi que les marches passes par Entente directe seront soumis a la revue prealable de la Banque

1b.

Méthode de Passation des Marchés	**Seuil de la méthode de PM (USD)**	**Commentaires**
AOI (Fournitures et Services autres que les services de consultants)	3,000,000	Les marchés de Fournitures et les marches de Services autres que les services de consultants dont la valeur est supérieure ou égale à l'équivalent de 3,000,000 $US, seront passés par AOI.
AON (Fournitures et Services autres que les services de cons	3,000,000	Les marchés de Fournitures et les marches de Services autres que les services de consultants, dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 3,000,000 $US, pourront être passés par AON.
Consultations de Fournisseurs et Prestataires de services	100,000	Les marchés de Fournitures et les marches de Services autres que les services de consultants dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 100.000 $US, pourront être passés par la méthode de consultation de fournisseurs ou de prestataires.
AOI (Travaux)	N/A	Sans objet
AON (Travaux)	> ou = 200.000	Les marchés de Travaux dont la valeur est superieure ou egale à l'équivalent de 200.000 $US, seront passés par AON
Consultations d'entreprises	200,000	Les marchés de Travaux dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 200.000 $US, pourront être passés par la méthode de consultation d'entrepreneurs
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement		

AOI: Appel d'offres International; AON: Appel d'offres National

2. **Prequalification.** Les soumissionnaires pour _____ seront préqualifiés conformement aux clauses 2.9 et 2.10 des Directives. **Sans objet**

3. **Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires** (conformement aux clauses 3.17 des Directives): se réferer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque. **Sans objet**

4. **Réference du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:**

5. **Tout autre montage de de passation des marchés:** *[incluant la passation des marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable]* ***Sans objet***

6. **Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

III. Selection des Consultants

1. **Seuil de Revue à Priori**

1a. **Categorie de Consultants**

Categorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	200,000	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 200.000 US$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Firme de Consultant (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	50,000	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 50.000 US$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Consultants Individuels (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement		

1b. **Methodes de Sélection**

Methodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
Selection Basee sur la Qualite Technique et le Cout (SBQC)	> ou = 200,000	Tout contrat de firme de consultant
Selection au Moindre cout (SBMC)	< 100,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 200.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives relatives aux Consultants.
Selection Basee sur les Qualifications du Consultant (SBQ)	< 100,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1, 3.7 et 3.8 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Firme	Pas de seuil	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.9 à 3.12 des Directives relatives aux Consultants.
Selection de Consultant Individuel (SCI)	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.3 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Individu	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.4 des Directives relatives aux Consultants.
Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement		

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 200 000 $ par contrat peut être composée uniquement de nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives

   Note: la list des seuils de OPCPR peut être consultée ici http://go.worldbank.org/MKXO98RY40

3. **Tout autre montage de sélection de consultants:** *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement retroactif si cela est applicable]*

4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

Annexe 6

Plan de Passation des marchés pour Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants) Ministère de la Justice

Plan approuvé le : _____

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

								Préqualification											
	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/ Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature contrat (Date)	No. du contrat
Prévu			Réalisation des travaux d'aménagement dans les 12 juridictions pilotes	Works	Prior	AON	No	No			1-Mar-13	16-Mar-13	31-Mar-13	15-May-13	15-May-13	30-May-13	14-Jun-13	29-Jun-13	
Revisée					Prior	AON	No	No			1-Mar-14	16-Mar-14	31-Mar-14	15-May-14	15-May-14	30-May-14	14-Jun-14	29-Jun-14	
Realisée																			
Prévu																			
Revisée																			
Realisée																			

Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
	29-Jun-14
	30-Jun-14

Annexe 6

Plan de Passation des marchés de fournitures - Ministère de la Justice

Plan approuvé le : _____

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

								Préqualification													
	SL No.	No. de reference / de lot	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
Prévu	1		Fournitures d'équipement informatique et mobilier de bureau	Goods	Prior	AON	No	No			1-Jun-13	16-Jun-13	26-Jun-13	26-Jul-13	26-Jul-13	15-Aug-13	30-Aug-13	19-Sep-13			29-Jun-14
Revisée					Prior	AON	No	No			1-Jun-14	16-Jun-14	26-Jun-14	26-Jul-14	26-Jul-14	15-Aug-14	30-Aug-14	19-Sep-14			18-Dec-14
Realisée																					
Prévu	2		Réalisation d'une campagne de communication		Post	AON	No	No						30-Jan-00	30-Jan-00	19-Feb-00	1-Mar-15	21-Mar-15			15-Dec-15
Revisée					Prior	AON	No	No			1-Sep-14	16-Sep-14	26-Sep-14	26-Oct-14	26-Oct-14	15-Nov-14	30-Nov-14	20-Dec-14			31-Dec-16
Realisée																					
Prévu	3		Fourniture d'équipement informatique et de bureau en faveur de UGP											30-Jan-00	30-Jan-00	19-Feb-00	1-Mar-15	21-Mar-15			15-Dec-15
Revisée					Post	AON	No	No			1-Jun-13	16-Jun-13	26-Jun-13	26-Jul-13	26-Jul-13	15-Aug-13	30-Aug-13	19-Sep-13			18-Dec-13
Realisée																					
Prévu	4		Frais d'organisation de séminaires et de réception											30-Jan-00	30-Jan-00	19-Feb-00	1-Mar-15	21-Mar-15			15-Dec-15
Revisée					Post	AON	No	No			1-Mar-14	16-Mar-14	26-Mar-14	25-Apr-14	25-Apr-14	15-May-14	30-May-14	19-Jun-14			31-Dec-16
Realisée																					

Pour item 2, 3 et 4: Services autres que consultant

Total

Total euros

Annexe 6

Plan de Passation des marchés de consultant - Ministère de la Justice

Plan approuvé le : _____

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

A - Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication

	SL No.	No. de ref;/ de lot.	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Methode de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**
Prévu	1	c	Réalisation d'un recueil de données sur l'organisation et le fonctionnement de 12 juridictions pilotes relevant du MJL	Prior	Firm	SFQC	1-Dec-12	15-Jan-13	15-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	14-Feb-13	15-Apr-13	15-May-13	14-Jun-13
Revisée				Post	Firm	SBMC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	2	c	Etablissement des plans des batiments et occupation des sols de 12 juridictions pilotes relevant du MJL	Prior	Firm	SFQC	1-Dec-12	15-Jan-13	15-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	14-Feb-13	15-Apr-13	15-May-13	14-Jun-13
Revisée				Post	Firm	SBMC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	3	c	Conception et mise en œuvre d'un systéme de gestion en vue d'améliorer les performances des juridictions pilotes	Prior	Firm	SFQC	1-Dec-12	15-Jan-13	15-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	14-Feb-13	15-Apr-13	15-May-13	14-Jun-13
Revisée				Prior	Firm	SFQC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	4	c	Concours architectural pour la conception et le suivi de réalisation du projet de réaménagement des espaces intérieurs et accueil de 12 juridictions pilotes relevant du	Prior	Individual	SCI	1-Jan-13	31-Jan-13		15-Feb-13						30-Mar-13
Revisée				Prior	Individual	SCI	1-Sep-13	1-Oct-13		16-Oct-13						15-Nov-13
Realisée																
Prévu	5	c	Mise à Niveau des Capacités de Gestion des services centraux du MJL	Prior	Firm	SFQC	1-Dec-12	15-Jan-13	15-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	30-Jan-13	14-Feb-13	15-Apr-13	15-May-13	14-Jun-13
Revisée				Prior	Firm	SFQC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	6	c	Conception et mise en œuvre des outils de Suivi Évalutation du projet d'Amélioration des Performances	Prior	Firm	SFQC	1-Mar-13	15-Apr-13	15-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	15-May-13	14-Jul-13	13-Aug-13	12-Sep-13
Revisée				Prior	Firm	SFQC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	7	c	Développement d'un systéme d'information intégré pour l'amélioration des performances judicaires	Prior	Firm	SFQC	1-Mar-13	15-Apr-13	15-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	15-May-13	14-Jul-13	13-Aug-13	12-Sep-13
Revisée					Firm	SFQC	1-Aug-13	15-Sep-13	15-Sep-13	30-Sep-13	30-Sep-13	30-Sep-13	15-Oct-13	14-Dec-13	13-Jan-14	12-Feb-14
Realisée																
Prévu	8	c	Renforcement des capacités du MJL en matière de rédaction et diffusion des projets de textes juridiques	Prior	Firm	SFQC	1-Mar-13	15-Apr-13	15-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	30-Apr-13	15-May-13	14-Jul-13	13-Aug-13	12-Sep-13
Revisée					Firm	SFQC	1-Dec-13	15-Jan-14	15-Jan-14	30-Jan-14	30-Jan-14	30-Jan-14	14-Feb-14	15-Apr-14	15-May-14	14-Jun-14
Realisée																
Prévu	9	c	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication au MJL	Prior	Firm	SFQC	1-Jan-13	15-Feb-13	15-Feb-13	2-Mar-13	2-Mar-13	2-Mar-13	17-Mar-13	16-May-13	15-Jun-13	15-Jul-13
Revisée					Firm	SFQC	1-May-13	15-Jun-13	15-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	30-Jun-13	15-Jul-13	13-Sep-13	13-Oct-13	12-Nov-13
Realisée																
Prévu	10	c	Expert en gestion de projet	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée																
Realisée					Individual	SCI	1-Apr-13									
Prévu	11	c	Reconduction de Expert en gestion de projet	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée					Individual	SCI	1-Apr-14									
Realisée																
Prévu	12	c	Expert en passation de marché	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée																
Realisée					Individual	SCI	1-Apr-13									
Prévu	13	c	Complément Expert en passation de marché	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée					Individual	SCI	1-Dec-14									
Realisée																
Prévu	14		Assistant projet	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée																
Realisée					Individual	SCI	1-Apr-13									
Prévu	15		Reconduction contrat Assistant projet	Prior	Individual	SCI	1-Sep-12	1-Oct-12		16-Oct-12						28-Nov-12
Revisée				Prior	Individual	SCI	1-Apr-14									
Realisée																
			Total													
			Total euros													

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

CI : Consultant individuel

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
2-Dec-13			30-Nov-16
			16-Jan-14
2-Dec-13			30-Nov-16
			16-Jan-14
2-Dec-13			30-Nov-16
30-Nov-13			15-Dec-15
2-Dec-13			30-Nov-16
2-Dec-13			30-Oct-14
4-Mar-14			30-Mar-14
4-Jul-14			30-Oct-14
2-Dec-13			30-Jul-14
13-Dec-12			31-Dec-16
13-Dec-12			31-Dec-16
13-Dec-12			31-Dec-16
13-Dec-12			31-Dec-16
13-Dec-12			31-Dec-16
13-Dec-12			31-Dec-16

Renforcement de capacités

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Montant estimé	Durée estimée	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires

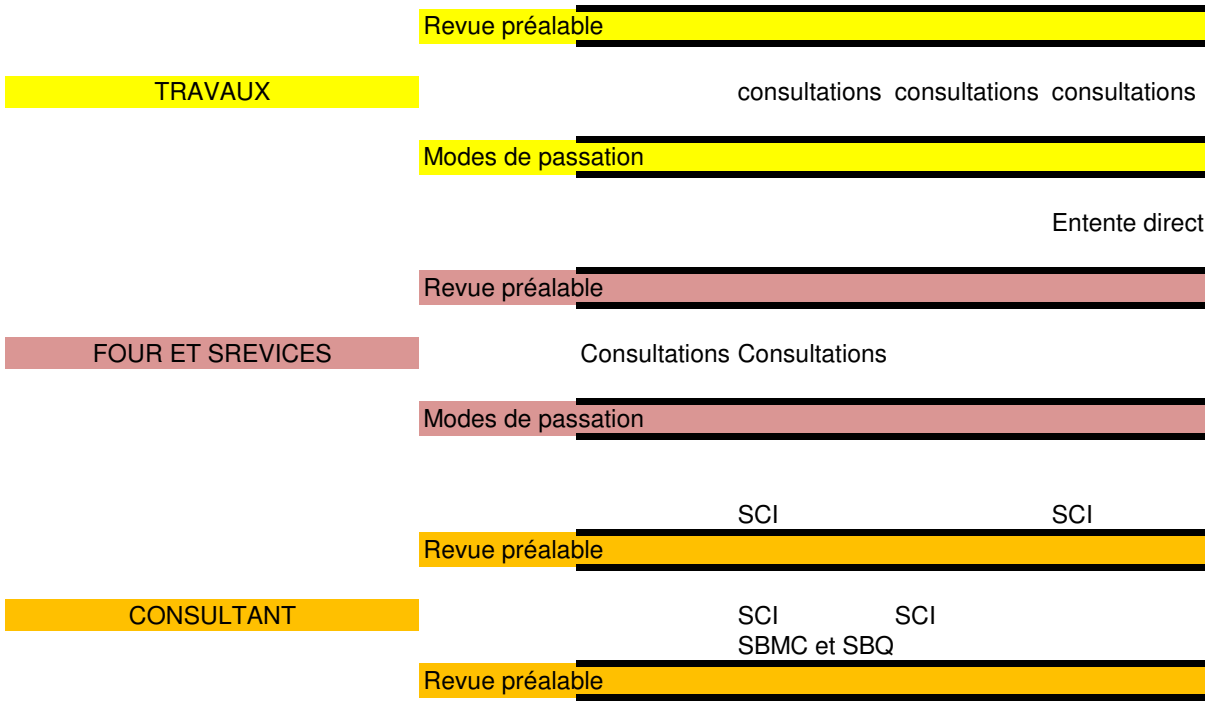
Revue préalable
TRAVAUX
consultations consultations consultations
Modes de passation
Entente direct
Revue préalable
FOUR ET SREVICES
Consultations Consultations
Modes de passation
SCI SCI
Revue préalable
CONSULTANT
SCI SCI
SBMC et SBQ
Revue préalable

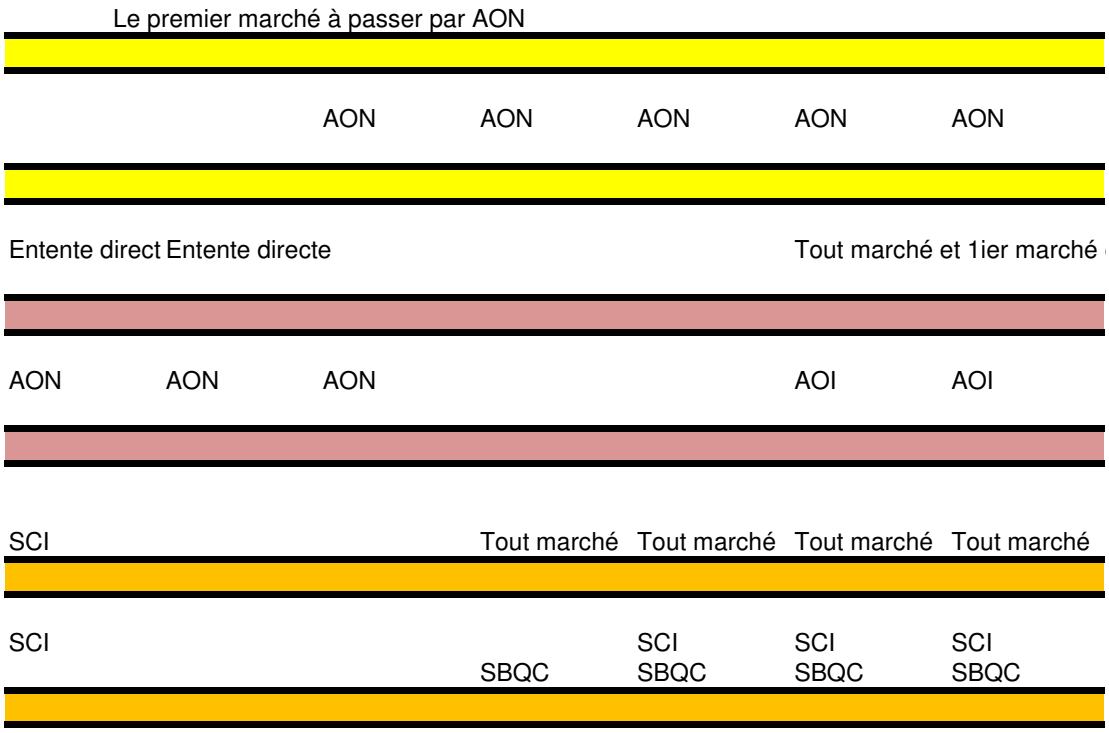
Le premier marché à passer par AON
AON AON AON AON AON
Entente direct Entente directe
Tout marché et 1ier marché
AON AON AON
AOI AOI
SCI
Tout marché Tout marché Tout marché Tout marché
SCI
SCI SCI SCI
SBQC SBQC SBQC SBQC

AON

en AON

AOI
